

2026 年 5 月 30 日

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

ウェブクランプ工法接合金物 製品検査

株式会社アイ・テック

確認


ウェブクランプ工法 接合金物製品検査		日時	2026 年 5 月 30 日	場所	(株)エヌダブル
				記録	荒木
出席者	(株)エヌダブル	鈴木様			
	奥田スチール(株)	濱様			
	(株)アイ・テック	荒木			
「熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事」のウェブクランプ工法接合金物 (28mm,SN490B, C490-R28-6M22)の製品検査を行った。 製品検査結果は書類不足のため全数不合格とし、次回同数を再検査することとした。 次頁に製品検査の要点をまとめたので、次回書類をそろえて再検査とする。 ① 全製品をジグに通して検査すること ② ②製品検査表に補正記録をメモすること 次回：2026 年 6 月 5 日 15:00～ (以上)					




製品のジグ検査の要点

- ① 検査ピンをボルト孔端部にちゃんと通して、精度が問題ないことを確認すること
- ② 隙間が過大にある場合は、矯正をかけること。矯正をかけたら、検査表にメモして、再度ジグを通して検査すること



溶接部の検査要点①

溶接端部に開先が残っていたら、40mm 以上をガウジングして再溶接をすること。この要領は 2026 年 5 月 15 日の報告書を参照すること

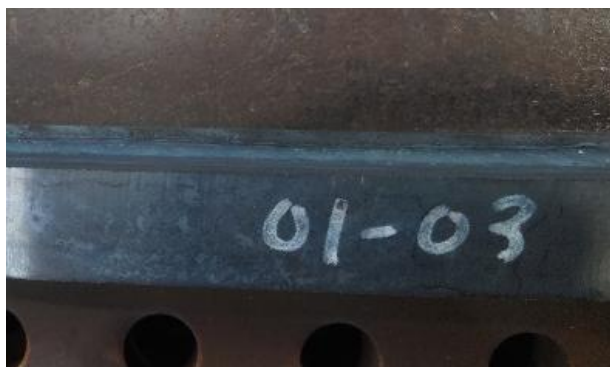

溶接部の検査要点②

溶接脚長の 5mm が、端部の側のみ不足する傾向にあるので、ちゃんと脚長を確保して溶接すること

溶接要領

単位：mm

tk1	28
S	13
D	8

